


# Naboinformasjon Campus Ullevål

Under følger generell info om fremdriften på prosjektet Campus Ullevål, Sognsveien 72, høsten 2023 – våren 2024.

- **Peling/ fundamentering** – uke 43-uke 8. Sterkt støyende arbeider. Da tomten i hovedsak består av leire, vil det ikke bli utført sprengning.

Sterkt støyende arbeider pågår i tidsrommet 08.00-17.00 med pause kl 11.00-12.00. Disse arbeidene pågår mandag – torsdag, med mulighet for arbeid også fredager.

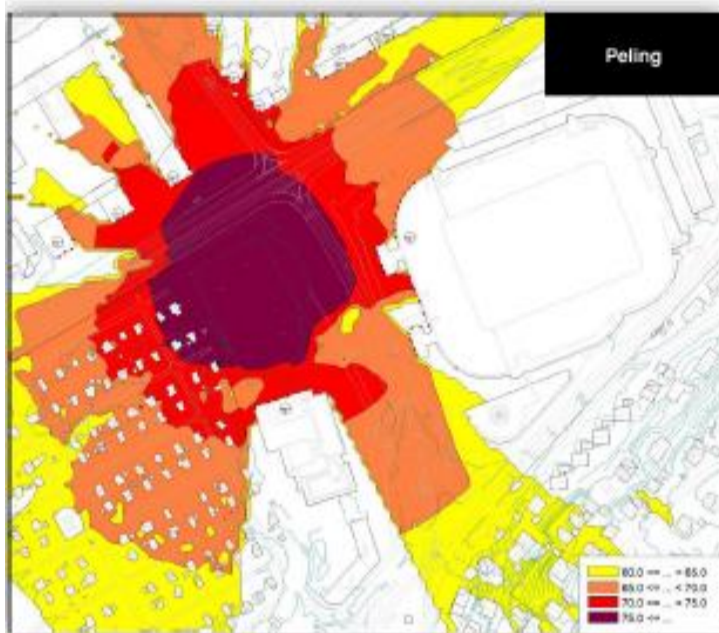

- **Støp av bunnplate** – medio februar 2024 – mai/juni 2024.
- **Støp av yttervegger og pilastre (kjeller)** – medio mars 2024 – juli 2024

Den generelle arbeidstiden på byggeplassen er mandag- fredag 07.00-19.00/15.00 (fredag) og i dette tidsrommet vil det være støy fra generell byggeaktivitet.

Naboinformasjon vil bli sendt ut av prosjektet ved jevne mellomrom og når prosjektet går inn i nye faser.

**Følg også status for prosjektet på:**

<https://blogg.skanska.no/campusullevål>

**Kontaktinfo byggherreorganisasjon:**

Mari Fossum Bryhn

mari.fossum.bryhn@insenti.no

Tlf. 936 08 940

